

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.281	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		2 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE BAIRRO DOS BARNABES		CÓDIGO DO PRÉDIO 120102
LOCAL JUQUITIBA		PI (PORTAL) 2026/02404
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00820/26-001-001
EMPREITEIRO UP! RIGHT ENGENHARIA		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	0	Seco	Parado	0%
07/10/2026	qua	0	Seco	Parado	0%

2 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 0%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	11,5%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	0%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	0%	LO nº 1 de 03/08/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Piso cozinha - Rede de esgoto

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:14): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

7 pedidos no Sienge · 5 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 1.115,00 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 08/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57609 07/10/2026	KENNEDY FERREIRA MENDES 36941412860 pedido há 1 dias	25765 - CAÇAMBA — 1 un	R\$ 600,00	PENDENTE falta R\$ 600,00
57656 07/10/2026	TRANSCELSO TRANSPORTES LTDA pedido há 1 dias	6420 - FRETE — 2 vb	R\$ 515,00	PENDENTE falta R\$ 515,00

Solicitações sem pedido de compra (2) — ≈ R\$ 480,00 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31755 07/10/2026	FINALIDADE: COZINHA solicitado há 1 dias	SOLEIRA CORUMBA 1,00M X 0,2M — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31774 07/10/2026	FINALIDADE: LIMPEZA *ENTREGA: SEXTA-FEIRA* solicitado há 1 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Pendências em aberto • Porcelanato • Argamassa • Definição fiscalização e diretoria de ensino onde realizar a ligação da rede de esgoto

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

07/10/2026

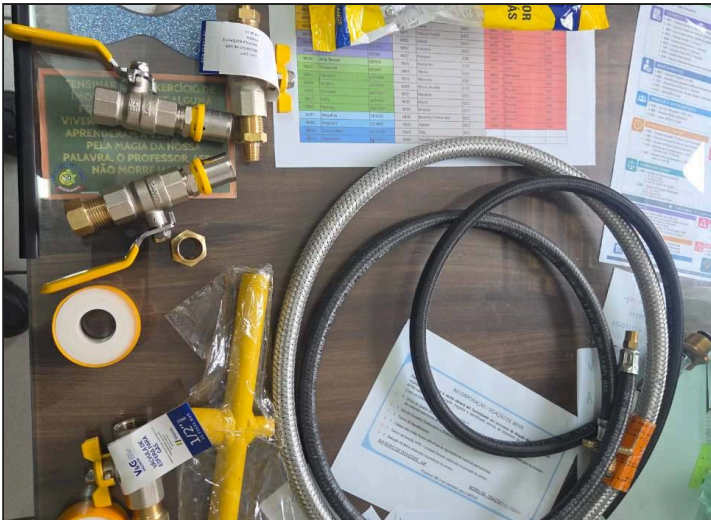


Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

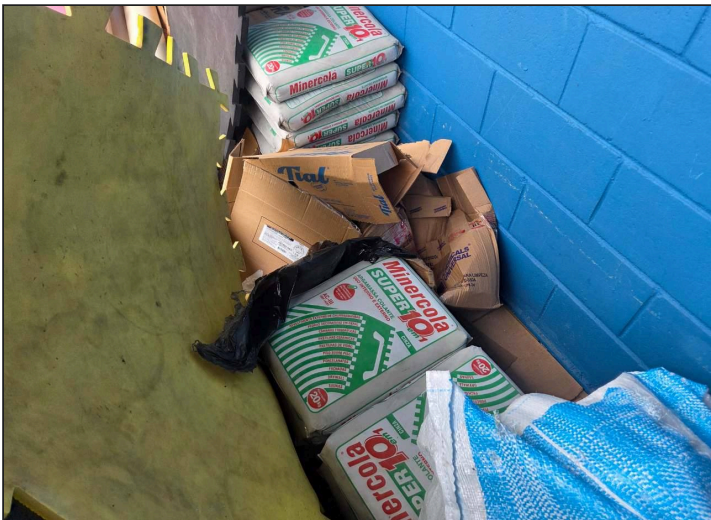

Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

DOUGLAS
Eng. responsável — contratada

UP! RIGHT ENGENHARIA
Empreiteiro

GUILHERME
Fiscal / FDE
