

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.284	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE PROFA IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO		CÓDIGO DO PRÉDIO 117116
LOCAL ITAPEVI		PI (PORTAL) 2026/02180
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00639/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Seco	Parado	99%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 99%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	42,2%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	99%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	45%	LO nº 3 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- OBRA COM ENTREGA PREVISTA PARA QUINTA-FEIRA - CONFORME ALINHADO COM O FISCAL
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:14): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

7 pedidos no Sienge · 5 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 5.400,00 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 08/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57239 01/10/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 7 dias	7705 - Fechadura tipo livre / ocupado — 8 un	R\$ 400,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 06/10/2026 01:21
57453 05/10/2026	53.014.968 HELENO BARBOSA DE LIMA pedido há 3 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 5.000,00	PENDENTE falta R\$ 5.000,00

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Recomendações à contratada

- APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto


- 01 - PENDÊNCIA DE ACABAMENTOS DOS REGISTROS HIDRÁULICOS
- 02 - INSTALAÇÃO DE TRINCOS NAS PORTAS DOS BOXES
- 03 - FALTA DE ACABAMENTO NAS PORTAS DOS BOXES, COM MASSA APARENTE
- 04 - FALTA DE DESCARGAS NOS MICTÓRIOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

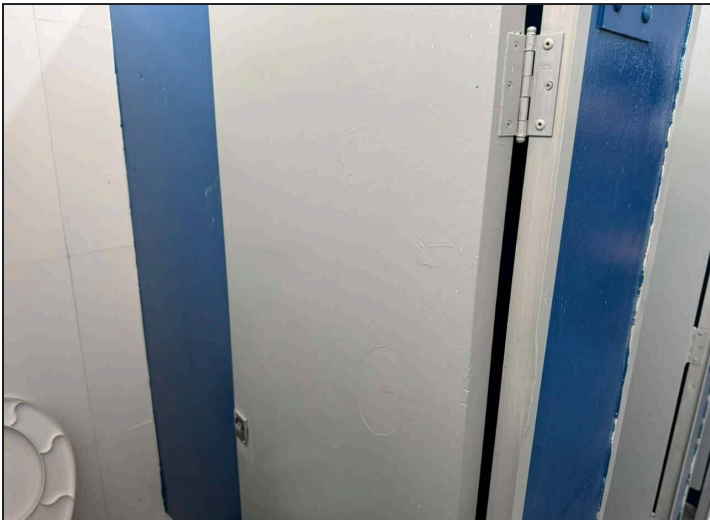


PENDÊNCIA 03

06/10/2026

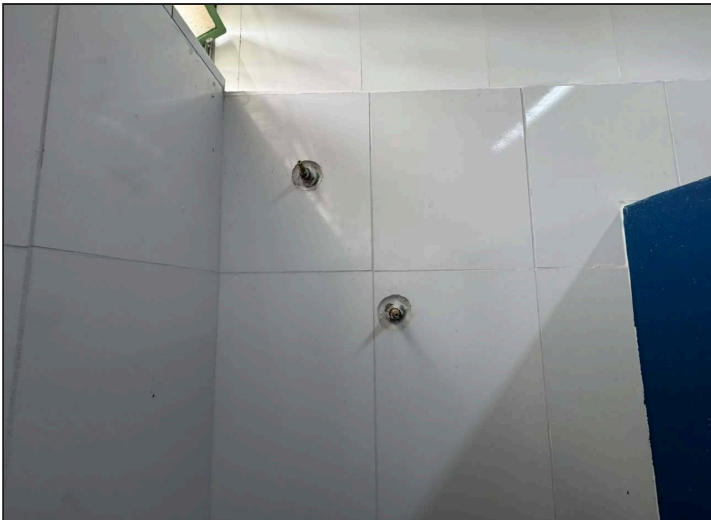


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

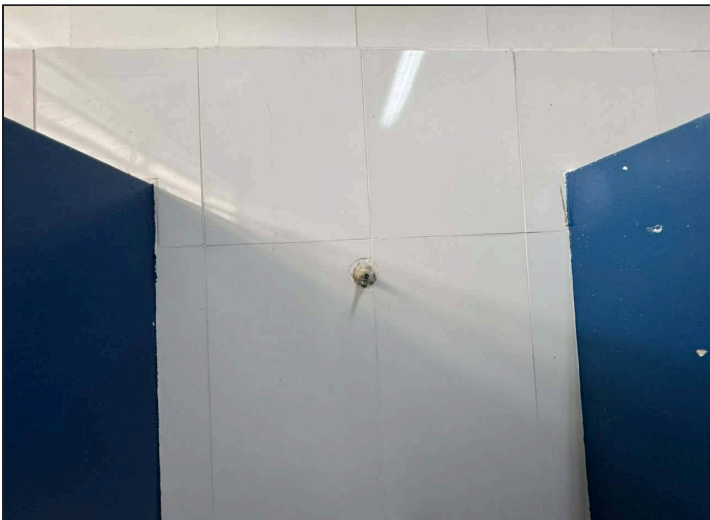


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

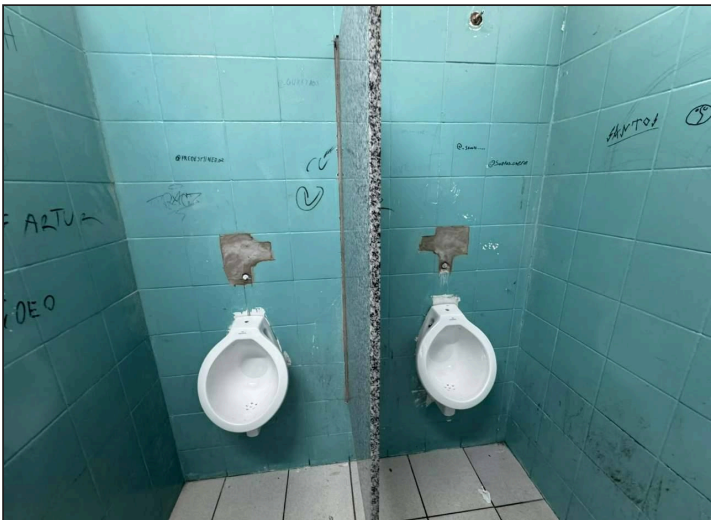


PENDÊNCIA 04

06/10/2026

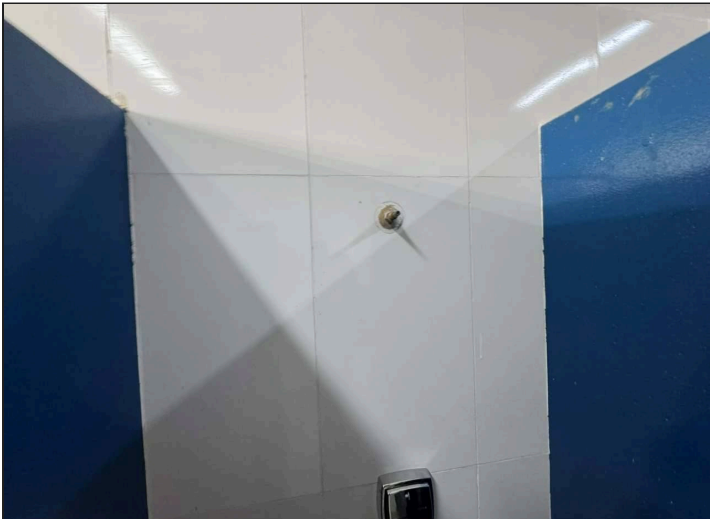


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

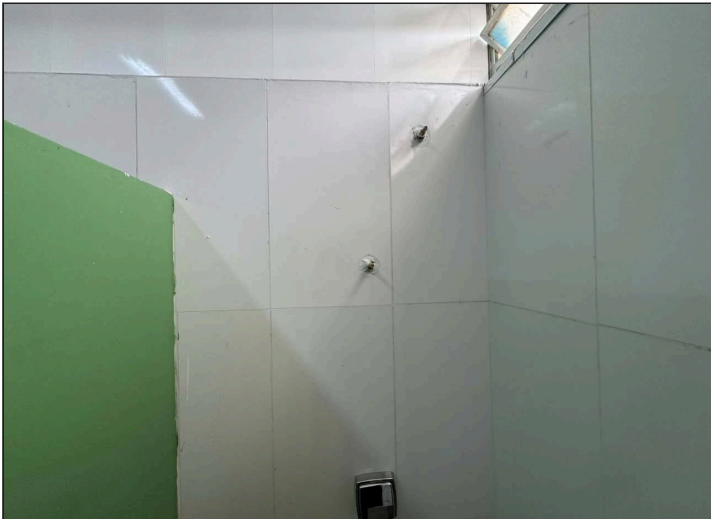


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

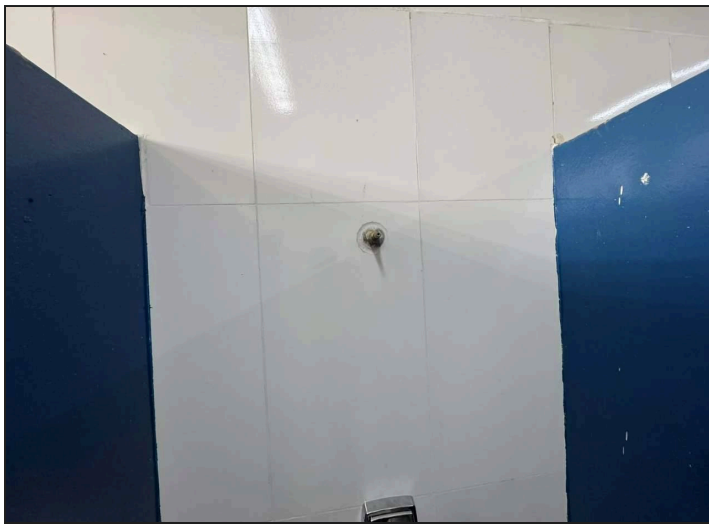


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

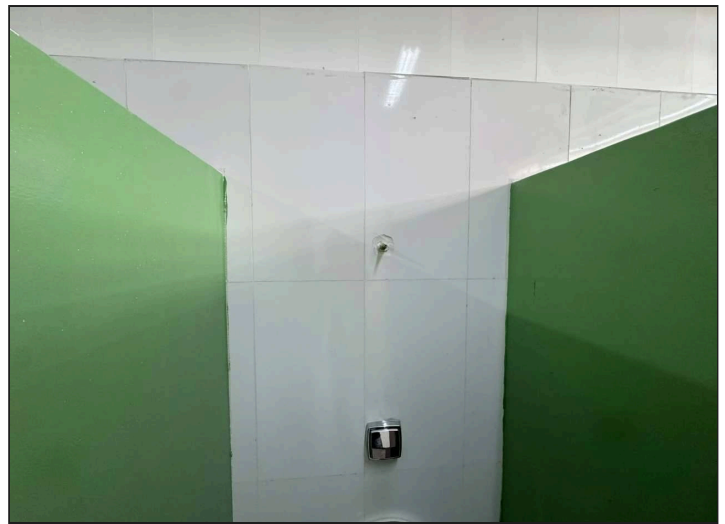


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

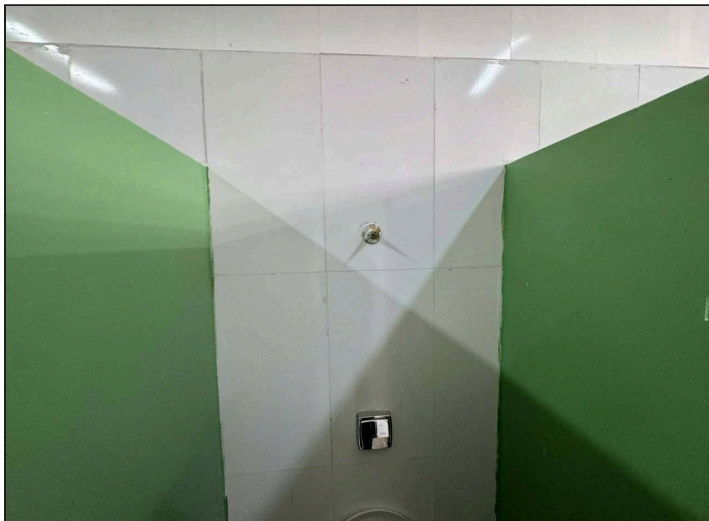


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

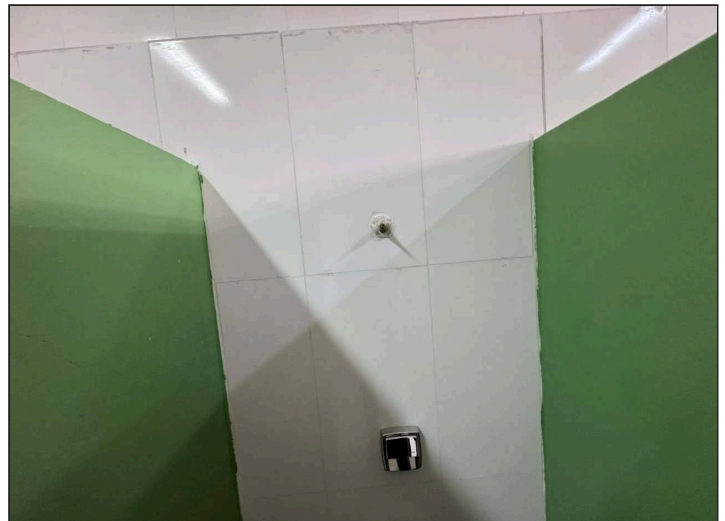


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

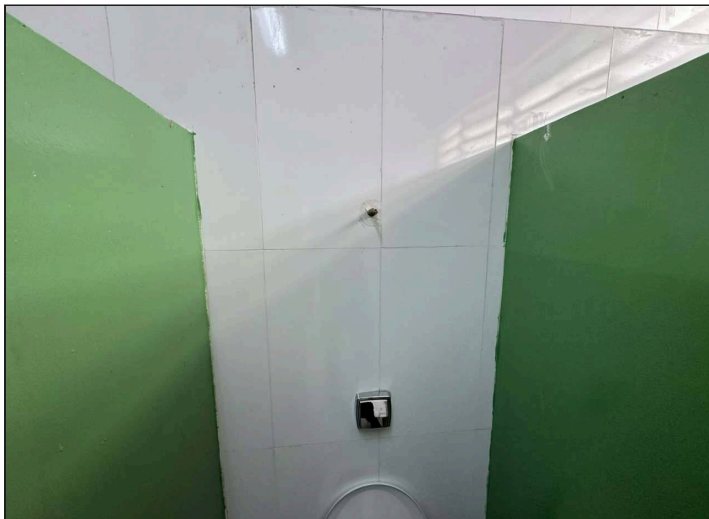


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

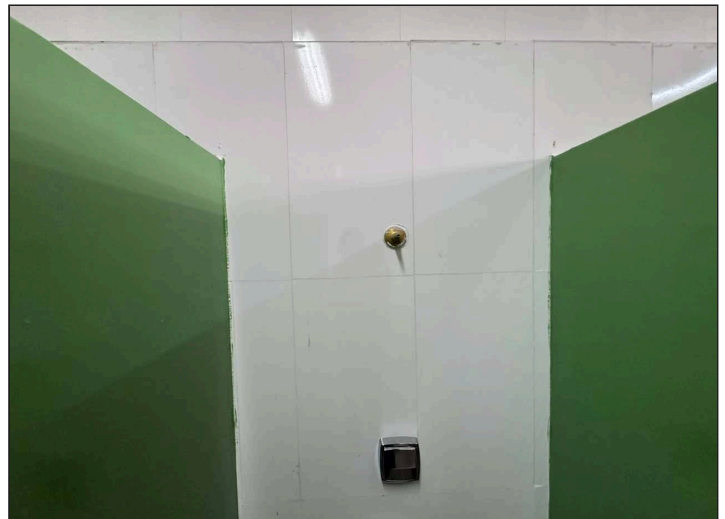


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

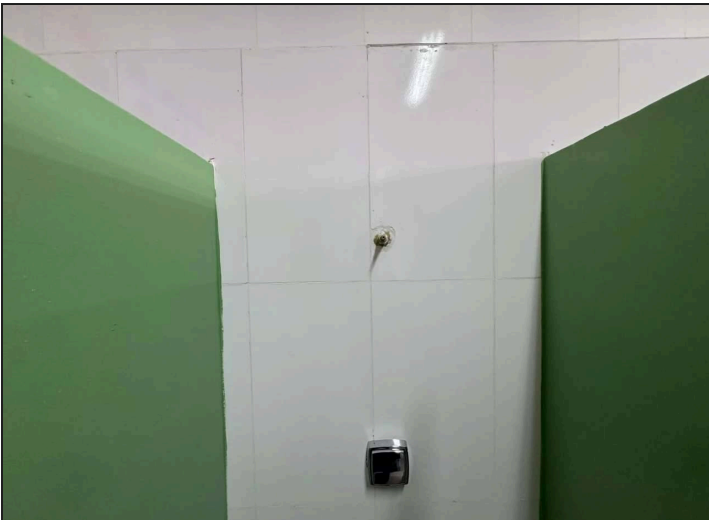

PENDÊNCIA 01

06/10/2026

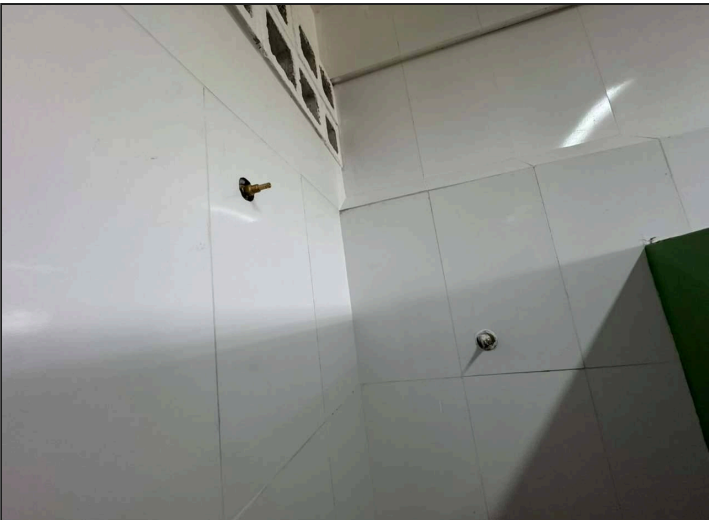

PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 02

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ANTONIO CABELO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
--	--	---
