

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.286	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE MARIA CATHARINA COMINO		CÓDIGO DO PRÉDIO 136112
LOCAL TABOÃO DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01150
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00188/26-001-001
EMPREITEIRO LUCAS EMPREITEIRO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Seco	Parado	25%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 25%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	13%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	23%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Pintura estrutura quadra - Pintura interna - Elétrica

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:16): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

19 pedidos no Sienge · 18 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 10.000,00 a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 08/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57383 05/10/2026	WOLF ENGENHARIA LTDA pedido há 3 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 10.000,00	PENDENTE marcado por Luis Júnior (resposta no grupo) · 07/10/2026 20:47 não entregue — Lucas, grupo 07/10

Solicitações sem pedido de compra (11) — ≈ R\$ 63.754,35 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29572 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 87 dias	Luva 100mm — 10 un · R\$ 37,80 TUBO PVC 100MM — 4 br · R\$ 560,00 CURVA 45 X 100MM — 10 un ≈ R\$ 597,80 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29573 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 87 dias	Tubo pvc ocre 200mm — 10 br · ≈ R\$ 5.683,30 TC-11 35CM — 100 m · ≈ R\$ 10.166,00 ≈ R\$ 15.849,30 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29575 13/07/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 87 dias	ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29578 13/07/2026	FINALIDADE: COMPONENTE ESPORTIVO *TABELA EM CHAPA DE COMPENSADO COM COLAGEM FENÓLICA, E = 20 MM E REQUADRO COM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO "U" OU "L"; ARO COM DIÂMETRO INTERNO DE 450 MM EM BARRA REDONDA GALVANIZADA DE 16 MM < Ø < 20 MM; REDE EM MALHA DE NYLON PRESAAO ARO EM 12 PONTOS, COMPRIMENTO ENTRE 400 A 450 MM; SUPORTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 3/16"* solicitado há 87 dias	QE-02 Poste para rede de voleibol — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 Trave de futebol de salão — 2 un · R\$ 2.357,00 TRELIÇA: CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS "L" EM AÇO ASTM A-36: 1 1/2" X 1/8" (38 X 3,2 MM); 1 1/4" X 1/8" (32 X 3,2 MM) E 2 1/2" X 3/8" (64 X 9,5 MM) — 2 un ≈ R\$ 3.797,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29580 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 87 dias	FORMA DE PAPELÃO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30182 04/08/2026	FINALIDADE: COBERTURA METÁLICA BLOCO 01 solicitado há 65 dias	Eletrodo 3,25mm — 5 kg · R\$ 147,15 PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE COM ARRUELA 5,5X38MM — 1.000 un · R\$ 500,00 VIGA UE 127X50X17MM #2,65MM — 110 br · R\$ 23.485,00 DISCO DE CORTE INOX 180X1,6X22MM (7"X1/16"X7/8") — 50 un · R\$ 380,00 ≈ R\$ 24.512,15 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30724 25/08/2026	FINALIDADE: CANALETA EM TORNO DA QUADRA *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 44 dias	TAMPA DE CONCRETO PADRÃO FDE 59,5 CM X 24,5 CM TC-10 — 80 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30944 02/09/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 36 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31087 09/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 29 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31184 16/09/2026	FINALIDADE: PINTURA E ELÉTRICA solicitado há 22 dias	Rolo de Espuma 9cm — 10 un · R\$ 80,00 Cabo flex 4mm² preto — 100 m · R\$ 435,00 Cabo flex 4mm² azul — 100 m · R\$ 435,00 Terminal pino 2,5mm — 1 pct Cabo flex 2,5mm² preto — 100 m · R\$ 252,00 cabo flex 2,5mm azul — 100 m · R\$ 252,00 TINTA ACRILICA CONCRETO 18L — 15 lt · ≈ R\$ 4.152,90 Rolo lã de carneiro 23cm — 3 un · R\$ 210,00 Disjuntor bipolar 60A — 1 un · R\$ 69,90 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A — 8 un · R\$ 70,40 ≈ R\$ 13.238,10 estimado ... e mais 4 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31647 02/10/2026	FINALIDADE: TELHADO *A PARTIR DE 05/10 ORGANIZAR ENTREGA COM DOUGLAS, POR FAVOR.* solicitado há 6 dias	CAÇAMBA — 10 un · R\$ 4.800,00 ≈ R\$ 4.800,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Observações - Sala dos professores, luminaria sem funcionar - Sala coordenadora 1pav, pintura sem realizar - Cobertura parada - Piso pátio sem finalizar a mais de 40 dias Recomendações à contratada - Aumentar efetivo, finalizar adequação hidráulica incêndio, e finalizar piso pátio Pendências em aberto - Tampa de concreto canaleta

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026

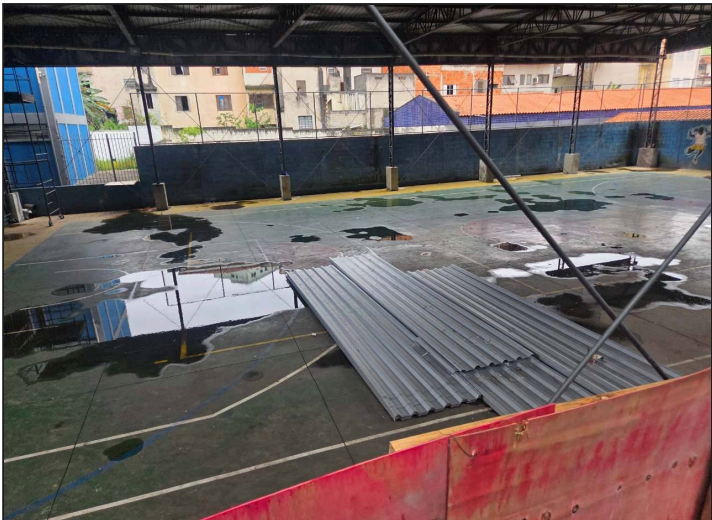

Registro da visita

05/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	LUCAS EMPREITEIRO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--
