

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.288	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EDUARDO VAZ	CÓDIGO DO PRÉDIO 109111	
LOCAL EMBU DAS ARTES	PI (PORTAL) 2025/04667	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00007/26-001-001	
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	25%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **25%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	9%	M001 a M002 aprovadas · M003 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	20%	LO nº 9 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Execução da limpeza da obra - Remoção de telhas e madeiramento
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:16): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

14 pedidos no Sienge · 14 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (9) — ≈ **R\$ 37.743,95** estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29584 13/07/2026	FINALIDADE: FORRO SALA DE AULA solicitado há 87 dias	Balde (20kg) Massa Corrida — 20 un · R\$ 1.047,40 PERFIL F 530 - CANALETA — 427 pç · R\$ 5.525,38 PENDURAL F 530 — 1.000 un · R\$ 1.220,00 UNIÃO F 530 — 380 un · R\$ 372,40 PARAFUSO PPA 25MM — 1.000 un · R\$ 20,00 PARAFUSO PFM 13MM — 2.000 un · R\$ 80,00 CHAPA DRYWALL ST BR 12,5MM 1200 X 1800 — 400 un · R\$ 16.464,00 TIRANTE RÍGIDO - NO. 10 (REB = 1,00 M) — 1.000 un · R\$ 1.550,00 FITA PARA JUNTA — 10 rol · R\$ 196,30 TABICA OU CANTONEIRA 25 X 30 X 3.000 - (*) — 247 un · ≈ R\$ 3.509,87 ≈ R\$ 29.985,35 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29935 23/07/2026	FINALIDADE: ESTRUTURA METÁLICA E INSUMOS PARA COBERTURA DA UNIDADE ESCOLAR *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 77 dias	ELETRODO 6013 2,5 — 40 kg · R\$ 748,00 Disco de corte 4" — 50 un · R\$ 160,00 Disco de desbaste 4" — 20 un · R\$ 140,00 DISCO DE CORTE 9" — 50 un · R\$ 2.000,00 VIGA U 150X60X20 X 2,65MM — 430 un VIGA U SIMPLES 100X40MM — 200 un ≈ R\$ 3.048,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30796 27/08/2026	FINALIDADE: TAPUME solicitado há 42 dias	TINTA LÁTEX PVA/ACRÍLICA, COR AZUL SERENO 18L — 1 lt · ≈ R\$ 365,00 TINTA LÁTEX PVA/ACRÍLICA, COR BRANCO 18L — 1 lt · ≈ R\$ 426,00 ≈ R\$ 791,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31183 16/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 22 dias	CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31220 16/09/2026	FINALIDADE: CALAFETAÇÃO DOS PARAFUSOS solicitado há 22 dias	Cola PU40 branco — 30 tb	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31223 16/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 22 dias	CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31231 16/09/2026	FINALIDADE: TELHADO solicitado há 22 dias	Roda para andaime — 8 pç · R\$ 182,64 Peças Andaime — 24 un · R\$ 406,56 TRAVA DIAGONAL — 4 un · R\$ 20,00 Plataforma 1,50m para andaime — 12 un · R\$ 248,40 Sapata para andaime — 8 un · R\$ 160,00 ESCADA — 1 un · R\$ 22,00 ≈ R\$ 1.039,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31334 21/09/2026	FINALIDADE: ELETRICA *LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO RENDIMENTO DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED T8 2X18W FDE - IL-45* solicitado há 17 dias	SOQUETE PARA LAMP. FLUORESCENTE ENCAIXE RAPIDO — 240 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31528 28/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA solicitado há 10 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- Agilizar a limpeza da obra e melhorar isolamento dos materiais e locais de trabalho

Pendências em aberto

- Isolamento material

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026

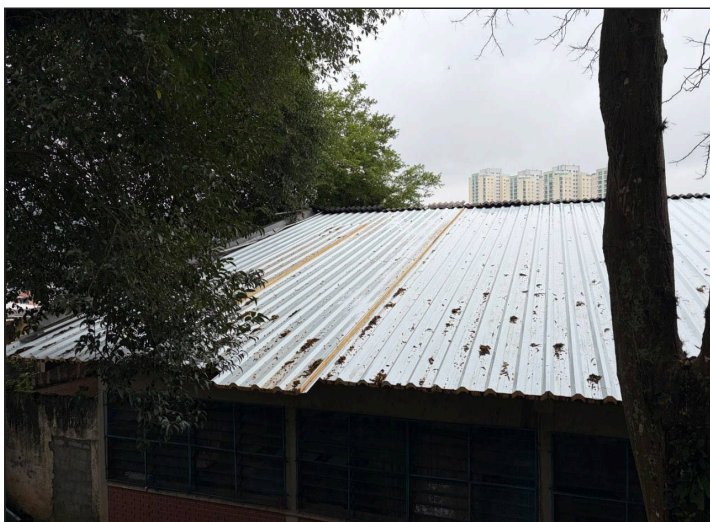

Telha em cima podendo voar

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026

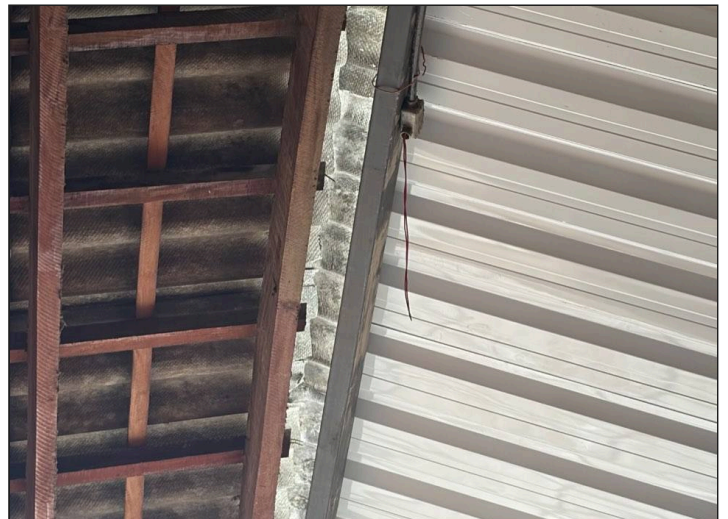


Tubulação e cabos pendurados

05/10/2026

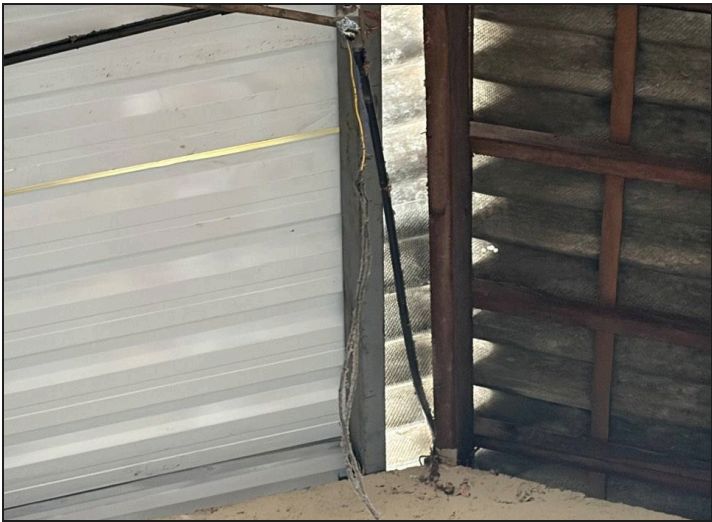


Vão entre telhas instaladas

05/10/2026

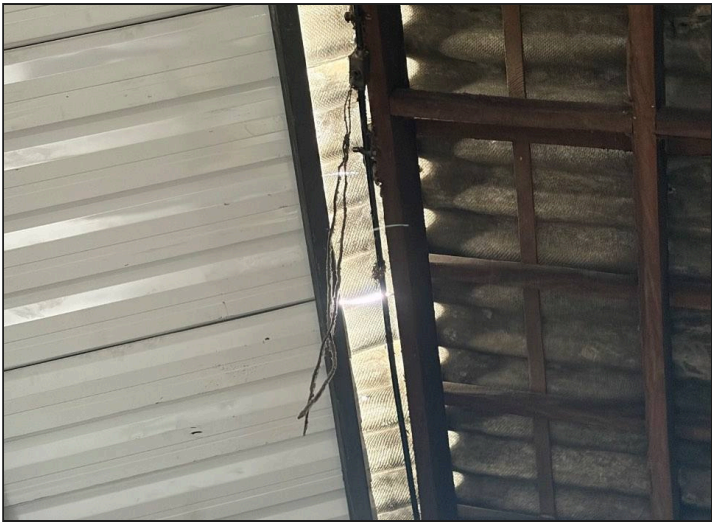

Tubulação e fios penduras

05/10/2026

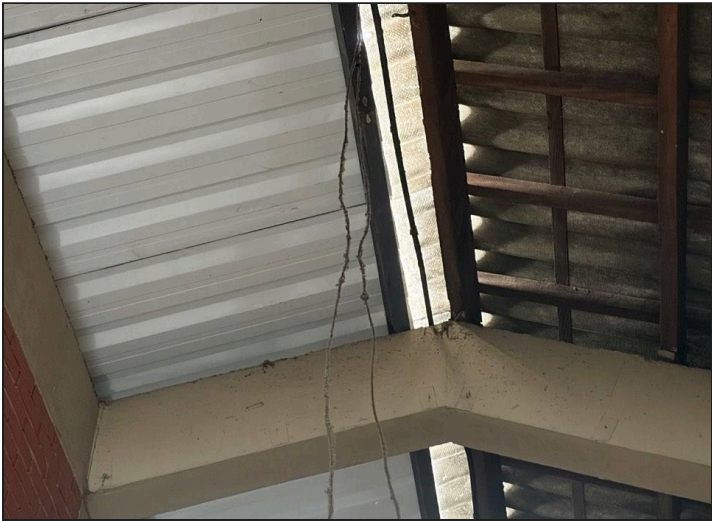

Tubulação e fios pendurados

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ ANTONIO CABELO Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	---	---
