

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 28/09/2026 · 11:39
Obra: 224
Vistoria por: Reginaldo Eder
código 224-murbgfv2

UNIDADE DE ENSINO 224 — ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO		MUNICÍPIO ITAPEVI / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00338/26-001-001	PI 2026/00492	ORDEM DE SERVIÇO 70/00338/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRA / EMPREITEIRO B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA · empreiteiro ANTONIO CABELO		FASE DA OBRA NA VISTORIA Organização e limpeza pré eleições	
RESPONSÁVEL TÉCNICO —	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Reginaldo Eder	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE RODRIGO	PRAZO CONTRATUAL 270 dias	ENDEREÇO RUA, Luiza Prebotti Tasso 360
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 147 de 276 dias (53%) · restam 129 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

ÓTIMO

média ponderada 0,842 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

79%

Índice de conformidade

14

Itens avaliados (de 38)

16

Total de pontos (peso × nota)

1,143

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

2

Não conformidades abertas


Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 6 Bom 6 Ruim 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	5	0	1
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	6	0	4
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	0	1
23 · Gerais	4	2	2	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

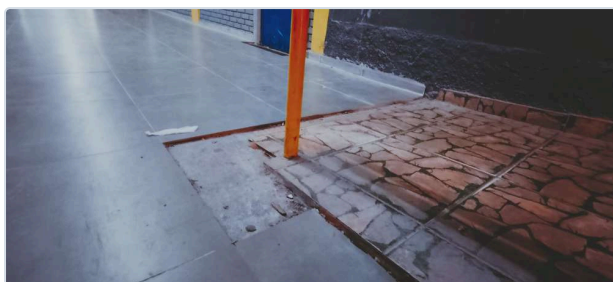

NC 1 · Piso com desnível acima, sentido do pátio para as salas de aula, falta dos recortes dos pisos no início da rampa, falta das soleiras das portas.

Item da vistoria 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)

Local Piso

Risco Entorses, luxações, quedas e até fraturas


Classificação **ALTO**

Ação corretiva Assentamento das peças faltantes com extrema urgência

Prazo 02/10/2026

Responsável Antonio / Ludmila

Status Aberta

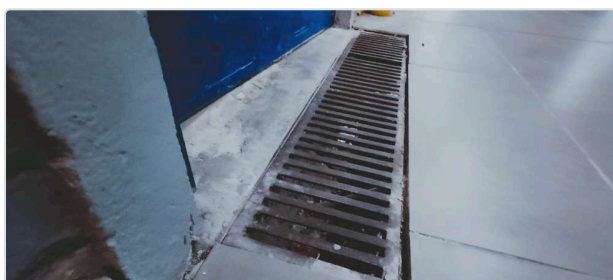

NC 2 · falta das soleiras das portas

Item da vistoria 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)

Local Piso

Risco Entorses, luxações, quedas e até fraturas

Classificação **ALTO**

Ação corretiva Assentamento das peças faltantes com extrema urgência

Prazo 02/10/2026

Responsável Antonio

Status Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	0 · Ótimo	0
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 14 itens · soma dos pesos 19				16

24 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3	Documentos — comunicação prévia		

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.4	Refeitório	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Sacos de argamassa na entrada do banheiro — ação: imediata / realocação dentro do tapume de isolamento	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de argamassa na entrada do banheiro — ação: imediata / realocação dentro do tapume de isolamento	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Organização e limpeza para as eleições
ITENS DE SST OBSERVADOS —	PENDÊNCIAS —	

