

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **224**

2 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO

224 — ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO

MUNICÍPIO

ITAPEVI / SP

CONTRATO FDE

70/00338/26-001-001

EMPREITEIRA / EMPREITEIRO

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA · empreiteiro
ANTONIO CABELO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

LEONARDO

FISCAL FDE

RODRIGO

PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA

início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 151 de 276 dias (55%) · restam 125 dias na sexta-feira

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
28/09/2026	Reginaldo Eder	Organização e limpeza pré eleições	ÓTIMO	0,842	79%	2
29/09/2026	Reginaldo Eder	Limpeza e organização do material da obra	ÓTIMO	0,955	76%	1


ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,955** · evolução na semana: 0,842 → 0,955 (piorou)
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA


DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
28/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Sacos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19
28/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19
29/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Os sacos de argamassa permanecem em frente ao banheiro	NR-18.19
29/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso sacos de argamassa impedem o acesso livre ao banheiro	NR-18.13
29/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Restos de material em locais de acesso. Os caos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

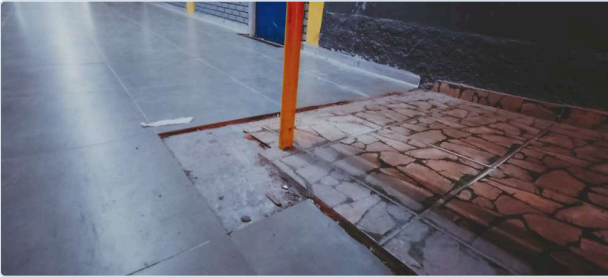


28/09/2026 · Piso com desnível acima, sentido do pátio para as salas de aula, falta dos recortes dos pisos no início da rampa, falta das soleiras das portas.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Assentamento das peças faltantes com extrema urgência
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio / Ludmila
Status	Aberta

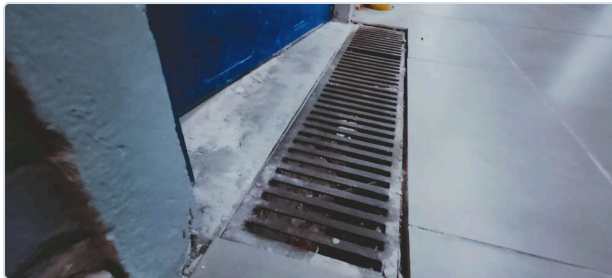

28/09/2026 · falta das soleiras das portas

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Assentamento das peças faltantes com extrema urgência
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio
Status	Aberta

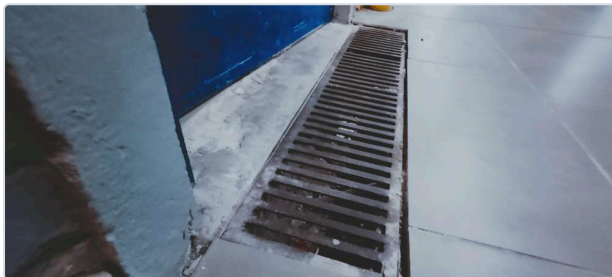

29/09/2026 · No piso novo foi deixado desnível no sentido do pátio para as salas de aula, possível ocasionador de tropeções. Falta de recortes e acabamentos do piso para rampa e falta das soleiras das salas. Todos podendo gerar entorses, quedas e ou tropeções.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso novo - Desníveis e falta de piso em alguns locais
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirada imediata/ colocação dentro da área isolada (tapume)
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio / Ludmila
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
28/09/2026	3	Organização e limpeza para as eleições		
29/09/2026	2	Limpeza e organização, foco no banheiro onde se concentrava material, ferramentas.		

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ANTONIO CABELO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:04 · consolidado de 2 vistoria(s) do formulário do painel (224-murbgfv2, 224-murandm7). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.
