

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.222	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 07/10/2026
		Visita: 13:51
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC Doutor Celso Giglio		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200297
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/00561
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00495/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / GUILHERME

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (3)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (35) % atual aprovado 20,7% · fiscal FDE 23% (LO 21/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	20,7%	M001 a M004 aprovadas · M005 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	35%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	23%	LO nº 11 de 21/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura laboratório de informática e circulacao

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Pendências em aberto

- Uso de EPI e isolamento dos locais de trabalho

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Isolamento equipamentos

07/10/2026




Pintura área administrativa

07/10/2026




Pintura a ser corrigida, escada administrativa

07/10/2026

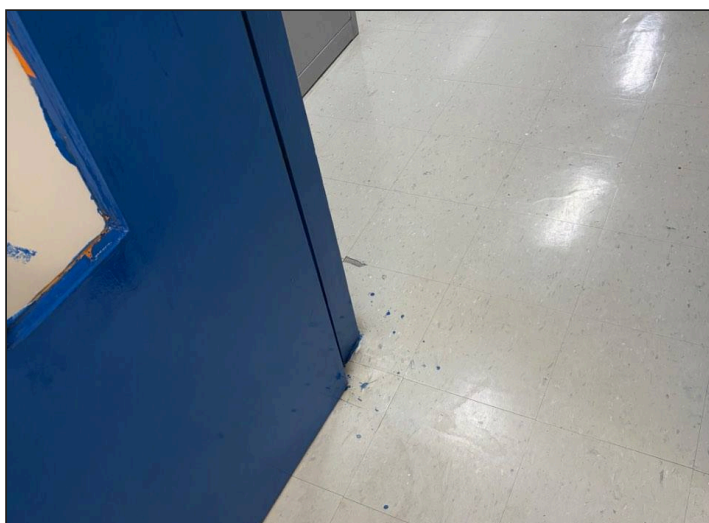

Respingo pintura piso, confirmar se equipe da obra executou

07/10/2026

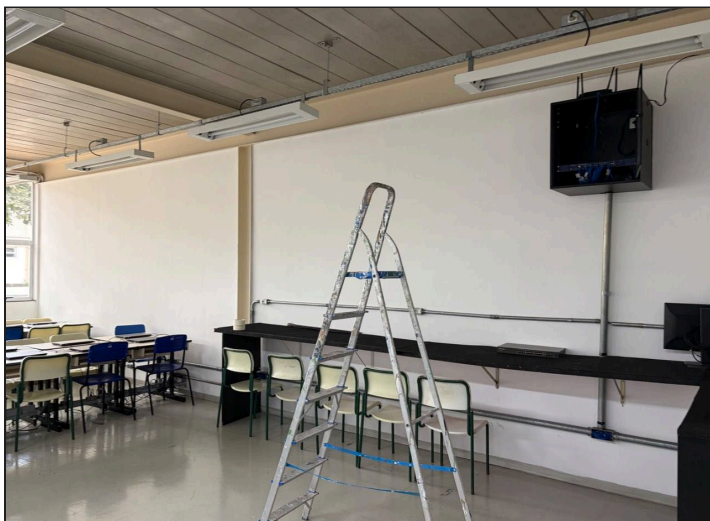


Registro da visita

07/10/2026



Aguardando definição piso vinílico

07/10/2026

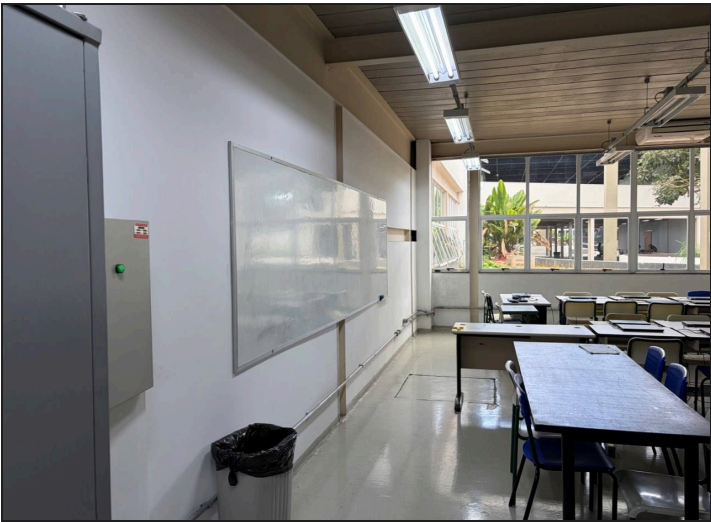

Pintura laboratorio

07/10/2026



Pintura laboratorio

07/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---
