

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.235	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 07/10/2026
		Visita: 11:50
		Preenchido por: Eng. Douglas
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE PROF MARIA CONCEICAO APARECIDA PEREIRA ISMAEL		CÓDIGO DO PRÉDIO 120203
LOCAL JUQUITIBA		PI (PORTAL) 2026/00999
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00360/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (80) % atual aprovado 81,9% · fiscal FDE 70% (LO 29/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	81,9%	M001 a M005 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	80%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	70%	LO nº 15 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cobertura e pintura

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

31 pedidos no Sienge · 31 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- Remover telha pendurada em muro
- Vazamentos calha e rufo

Recomendações à contratada

- Finalizar pintura de muros
- Estrutura cobertura, remover da passagem de alunos

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

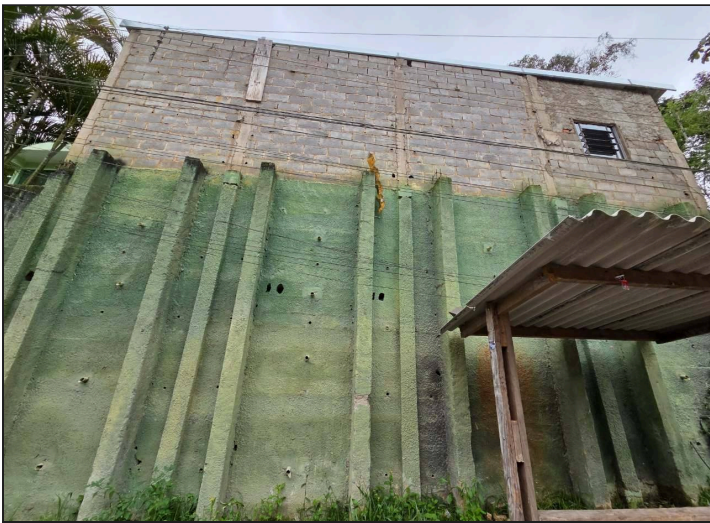


Registro da visita

08/10/2026

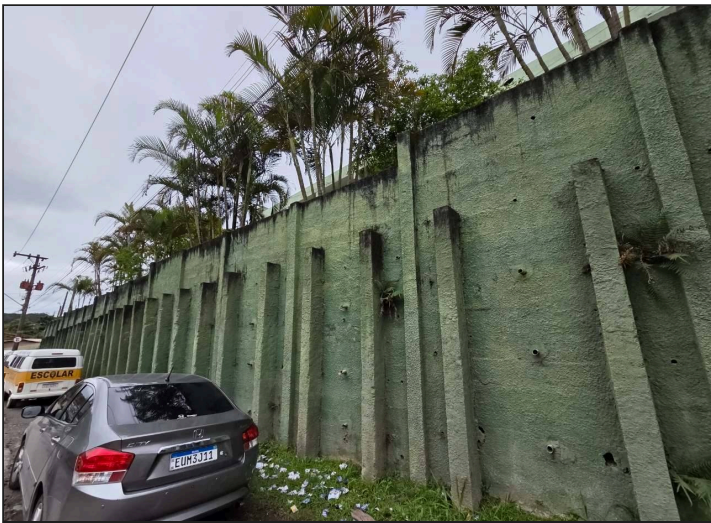

Registro da visita

08/10/2026

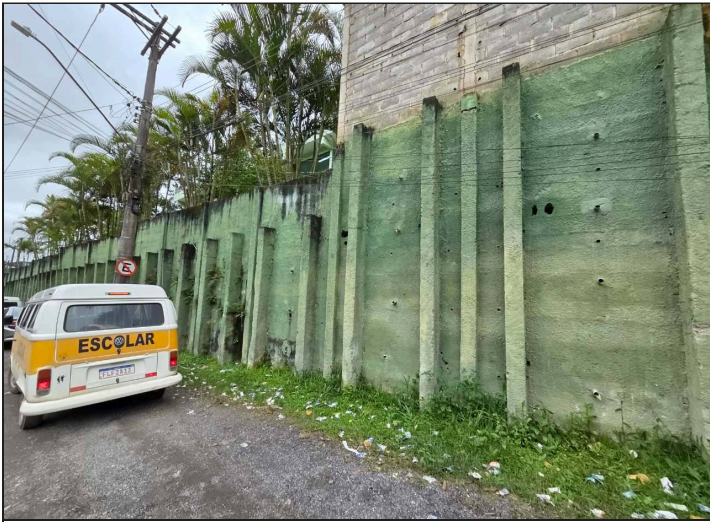


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

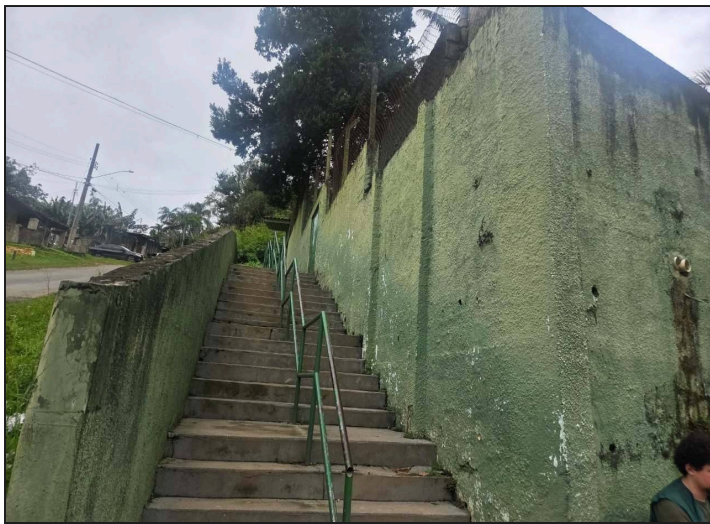


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

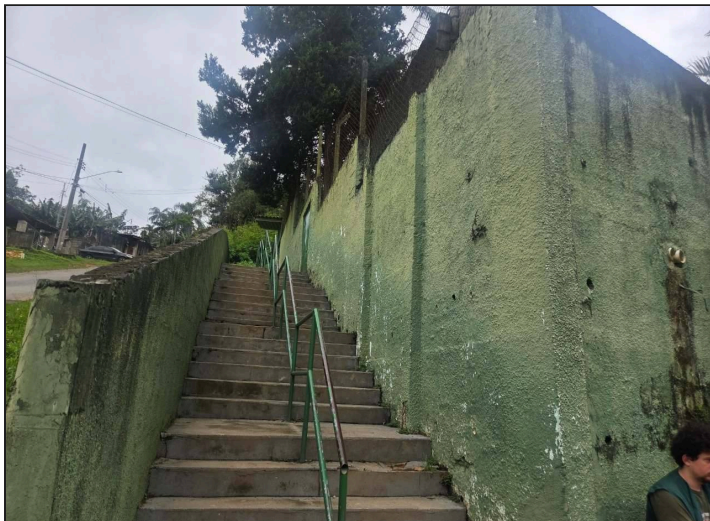

Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

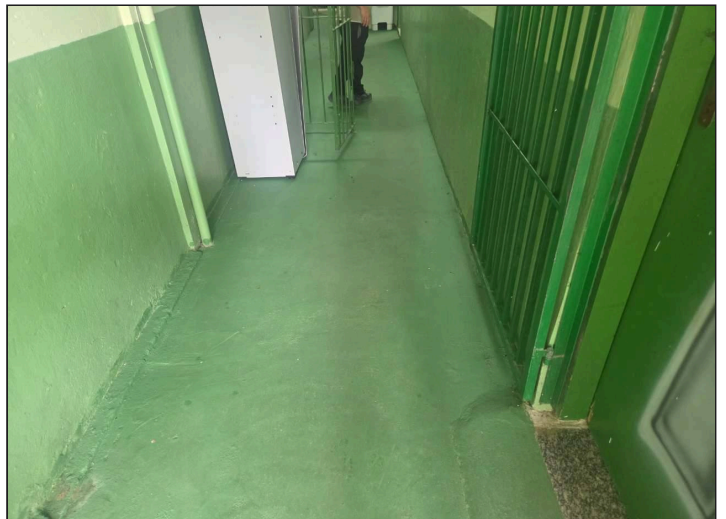

Registro da visita

08/10/2026

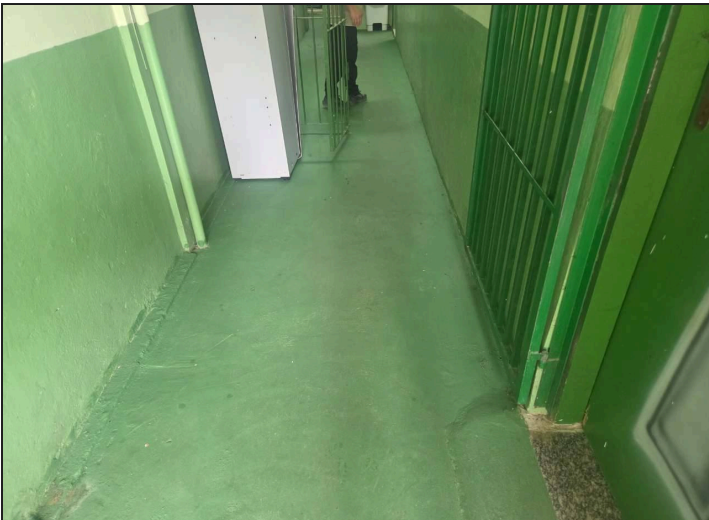


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

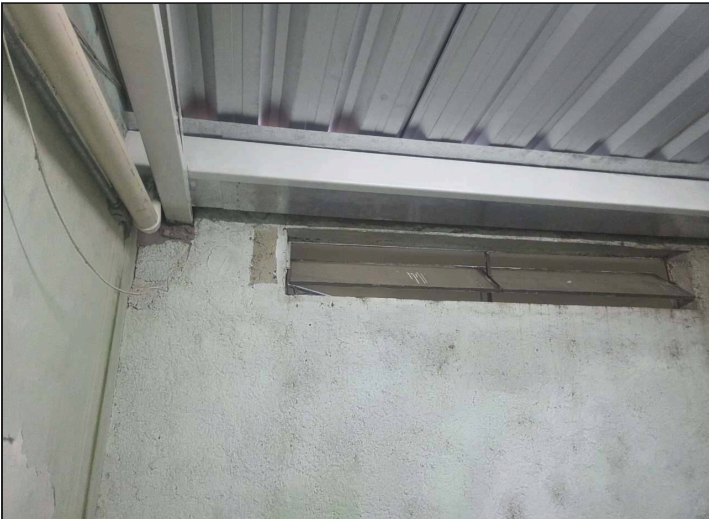

Registro da visita

08/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	ANTONIO CABELO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---
