

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.300	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE LEVI PEREIRA MARTINS		CÓDIGO DO PRÉDIO 110208
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/02343
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00826/26-001-001
EMPREITEIRO UP! RIGHT ENGENHARIA		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	0	Seco	Normal	80%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 80%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	45%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	80%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	48%	LO nº 4 de 19/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Infra elétrica - Todas e variadores sala de aula
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:13): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

6 pedidos no Sienge · 6 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (1)

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31073 09/09/2026	FINALIDADE: ELETRICA solicitado há 29 dias	SOQUETE PARA LAMP. FLUORESCENTE ENCAIXE RAPIDO — 240 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Observações

- Finalizar distribuição

Recomendações à contratada

- Limpeza material gerado, organização e
- Tampão em condutores e fechamentos de quadros

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

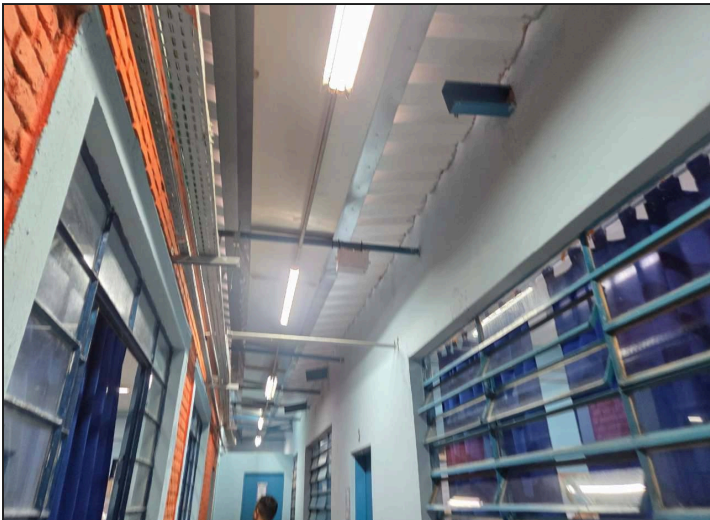

Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

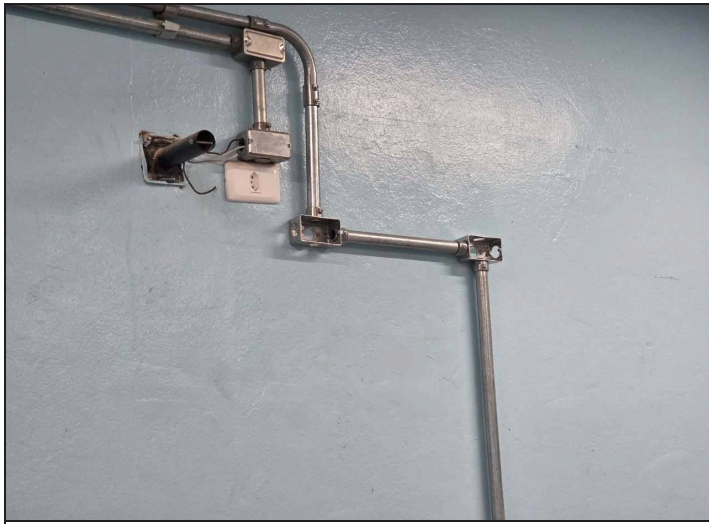


Registro da visita

08/10/2026

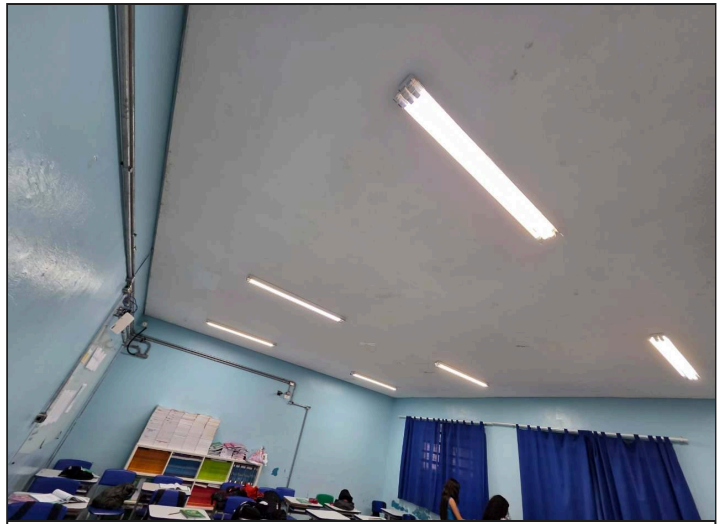

Registro da visita

08/10/2026

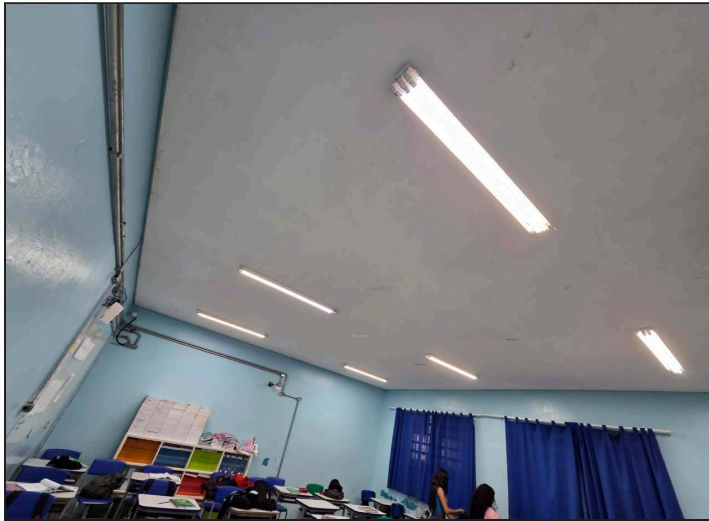


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

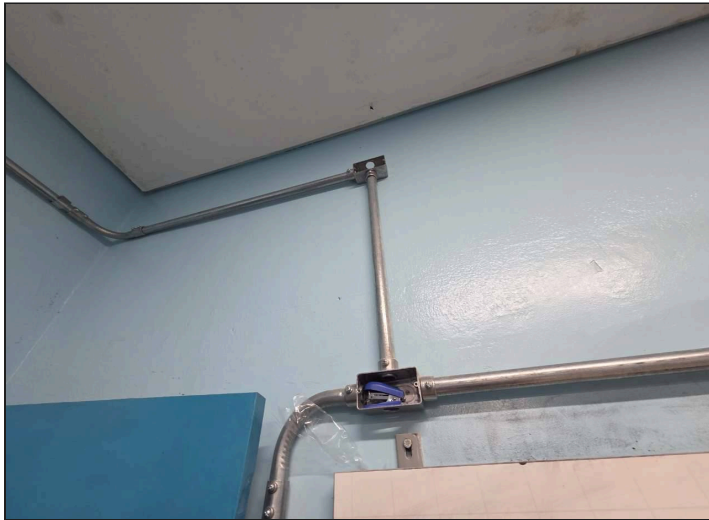

Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

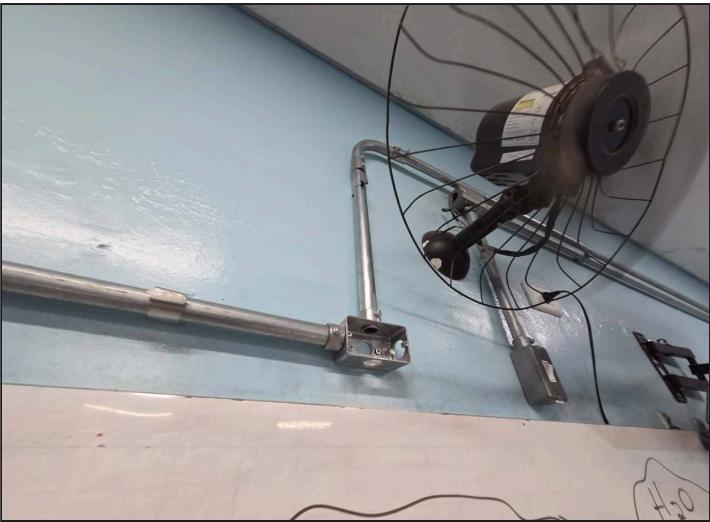

Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	UP! RIGHT ENGENHARIA Empreiteiro	GUILHERME Fiscal / FDE
---	--	--
