

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **36**

31/08/2026 a 04/09/2026

Obra: **282**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 282 — EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 03/07/2026 · término previsto 03/11/2026 · decorridos 63 de 123 dias (51%) · restam 60 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
31/08/2026	Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng. Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	8

RUIM situação na última vistoria (31/08/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
31/08/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas <i>Cabos/fiações acumulados e pendentes na parte superior da parede (EV 07).</i>	NR-18.21
31/08/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo <i>Luas e EPIs espalhados no piso, sem local de guarda definido (EV 03 e 06).</i>	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
31/08/2026	23.1	Armazenagem de materiais <i>Ferramentas, EPIs e materiais sem local identificado de guarda (EV 06 e 08).</i>	NR-18.19
31/08/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas <i>Resíduos, embalagens e objetos soltos no piso e junto às circulações (EV 03, 04 e 05).</i>	NR-18.19
31/08/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua <i>Barreira improvisada com estrado plástico apoiado sobre mobiliário (EV 01).</i>	NR-18.13
31/08/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso <i>Área em intervenção diretamente conectada a ambiente usado pela comunidade escolar (EV 02).</i>	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO




31/08/2026 · Foi identificada barreira improvisada com estrado plástico apoiado sobre mobiliário em frente à porta da área em reforma. Apesar da existência de placas, o bloqueio não oferece isolamento físico seguro.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Acesso à área em reforma
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Substituir por tapume ou barreira rígida, estável e contínua, com controle efetivo de acesso.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



31/08/2026 · A área em intervenção encontra-se diretamente conectada a ambiente utilizado pela comunidade escolar.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Interface entre a frente de obra e a área ocupada da escola
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Segregar integralmente a frente de obra da área ocupada, com sinalização visível, e impedir o ingresso de alunos, funcionários e terceiros.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

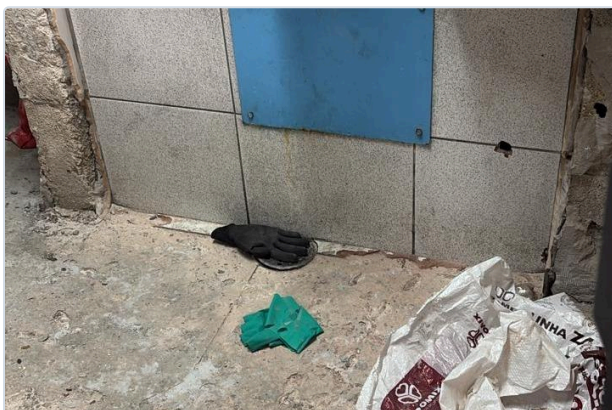


31/08/2026 · Observam-se sacos, embalagens, luvas e outros materiais espalhados no piso. A condição aumenta o risco de tropeços, quedas, cortes e contato indevido.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Frente de serviço — piso
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar rotina de limpeza e acondicionamento adequado dos resíduos, com recipientes apropriados.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



31/08/2026 · Sacos, embalagens e objetos encontram-se junto ao acesso e à área de passagem.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Acesso e área de passagem
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar materiais das circulações e definir local específico para armazenamento temporário.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

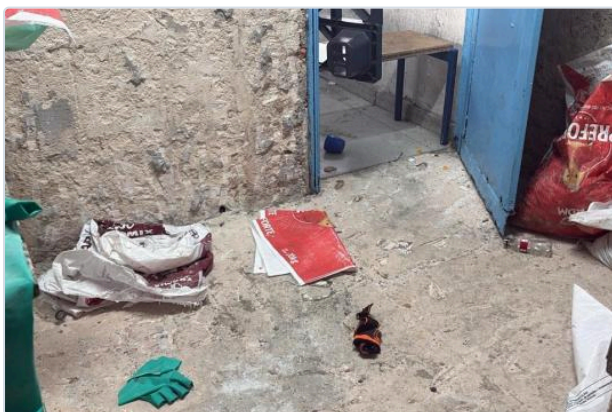


31/08/2026 · A frente de serviço apresenta resíduos e objetos soltos no piso, sem segregação adequada.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Frente de serviço — organização e limpeza
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Realizar limpeza contínua e ao final da jornada, mantendo somente os materiais necessários à execução.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



31/08/2026 · Ferramentas, luvas, recipientes e embalagens encontram-se apoiados de forma improvisada, sem local definido de guarda.

Item 23.1 — Armazenagem de materiais
Local Guarda de ferramentas e EPIs
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Definir local identificado para guarda de ferramentas e EPIs e separar materiais úteis dos resíduos.
Prazo —
Responsável Rafael
Status Aberta

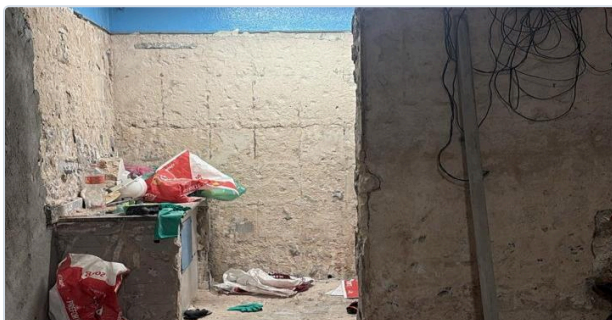

31/08/2026 · Foram observados cabos/fiações acumulados e pendentes na parte superior da parede.

Item 8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local Parede — cabos e fiações
Classificação **CRÍTICO**
Ação corretiva Organizar, fixar e proteger as instalações, verificando a condição elétrica e desenergizando quando aplicável.
Prazo —
Responsável Rafael
Status Aberta



31/08/2026 · Ambiente em reforma com ferramentas, carrinho de mão e materiais remanescentes.

Item 23.1 — Armazenagem de materiais
Local Ambiente em processo de reforma
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Manter circulação livre, organização contínua e acesso restrito até a conclusão e liberação formal do local, com inspeção e limpeza final.
Prazo —
Responsável Rafael
Status Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
31/08/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng.
Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Rafael
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-282-20260831). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.
