

# RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **233**

1 vistoria(s)

|                                                                                                                                                               |                                                                 |                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br><b>233 — EE JACIRA</b>                                                                                                                   |                                                                 | MUNICÍPIO<br><b>ITAPECERICA DA SERRA / SP</b> | CONTRATO FDE<br><b>70/00361/26-001-001</b> |
| EMPREITEIRO<br><b>RENILDO</b>                                                                                                                                 | CONTRATADA<br><b>ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br><b>DOUGLAS</b>      | FISCAL FDE<br><b>FABIO</b>                 |
| PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA<br><b>início 30/04/2026 · término previsto 30/11/2026 · decorridos 162 de 214 dias (76%) · restam 52 dias na sexta-feira</b> |                                                                 |                                               |                                            |

## VISTORIAS DA SEMANA

| DATA       | RESPONSÁVEL | FASE    | CLASSIFICAÇÃO            | MÉDIA | CONFORMIDADE | NC |
|------------|-------------|---------|--------------------------|-------|--------------|----|
| 07/10/2026 | Fernando    | Pintura | <b>REGULAR / ATENÇÃO</b> | 1,857 | 54%          | 5  |

**REGULAR / ATENÇÃO**

situação na última vistoria (07/10/2026) · média ponderada **1,857**  
**AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)**


## ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

| DATA       | ITEM | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                                 | NR                    |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 07/10/2026 | 17.1 | Proteção contra queda — telhado / cobertura<br><i>Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto</i>               | NR-35 / NR-18.16      |
| 07/10/2026 | 17.2 | Cabo guia / linha de vida instalada<br><i>Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto</i>                       | NR-35.5               |
| 07/10/2026 | 17.3 | Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura<br><i>Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto</i>             | NR-35.3               |
| 07/10/2026 | 20.1 | Andaimes / plataformas de trabalho<br><i>Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto</i>                        | NR-18.18              |
| 07/10/2026 | 20.4 | Guarda-corpo e rodapé<br><i>Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto</i>                                     | NR-18.18              |
| 07/10/2026 | 20.5 | Treinamento NR-35 dos montadores / usuários<br><i>Colaborador sem documentos</i>                                     | NR-35                 |
| 07/10/2026 | 22.1 | EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo<br><i>Colaboradores não usam epi</i>                       | NR-06.6.1 / NR-06.7.1 |
| 07/10/2026 | 23.1 | Armazenagem de materiais<br><i>Local desorganizado</i>                                                               | NR-18.19              |
| 07/10/2026 | 23.2 | Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas<br><i>Limpeza do local urgente conforme NR 18</i> | NR-18.19              |



**07/10/2026 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Item           | 17.1 — Proteção contra queda — telhado / cobertura |
| Local          | Quadra                                             |
| Classificação  | <b>CRÍTICO</b>                                     |
| Ação corretiva | Imediato                                           |
| Prazo          | 07/10/2026                                         |
| Responsável    | Reynildo                                           |
| Status         | Aberta                                             |

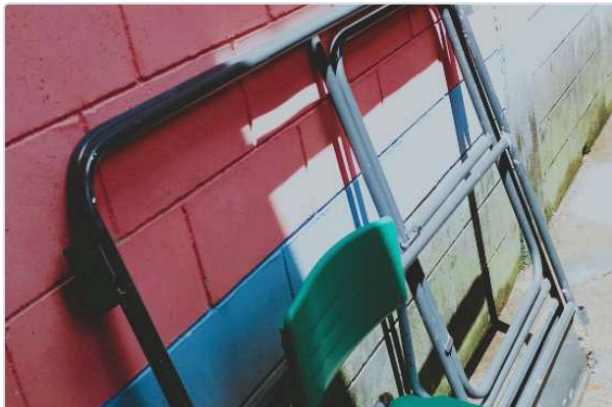

**07/10/2026 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Item           | 20.1 — Andaimos / plataformas de trabalho |
| Local          | Quadra                                    |
| Classificação  | <b>CRÍTICO</b>                            |
| Ação corretiva | Imediato                                  |
| Prazo          | 07/10/2026                                |
| Responsável    | Reynildo                                  |
| Status         | Aberta                                    |



**07/10/2026 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto**

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Item           | 17.3 — Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura |
| Local          | Quadra                                               |
| Classificação  | <b>CRÍTICO</b>                                       |
| Ação corretiva | Imediato                                             |
| Prazo          | 07/10/2026                                           |
| Responsável    | Reynildo                                             |
| Status         | Aberta                                               |



#### 07/10/2026 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Item           | 17.2 — Cabo guia / linha de vida instalada |
| Local          | Quadra                                     |
| Classificação  | <b>CRÍTICO</b>                             |
| Ação corretiva | Imediato                                   |
| Prazo          | 07/10/2026                                 |
| Responsável    | Reynildo                                   |
| Status         | Aberta                                     |



#### 07/10/2026 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Item           | 22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo |
| Local          | Quadra                                                           |
| Classificação  | <b>ALTO</b>                                                      |
| Ação corretiva | Imediato                                                         |
| Prazo          | 07/10/2026                                                       |
| Responsável    | Reynildo                                                         |
| Status         | Aberta                                                           |

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

Fernando  
Responsável SST

DOUGLAS  
Engenheiro responsável

RENILDO  
Empreiteiro
